

Comune di VILLASTELLONE
Città Metropolitana di TORINO
Ufficio Tecnico Comunale


Allegato n°2:
Sistemazione e manutenzione
straordinaria strade comunali-Anno 2022.
Cronoprogramma.
Progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo.

Villastellone, Maggio 2022

Il Progettista: Carpinello Ing. Roberto

Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI					
Località	Lavori/opere	Andamento settimanale		A sommare [€]	A sommare [€]
<i>Comune di Villastellone</i>	<i>Avvio cantiere</i>	0,00		0,00	0,00
	<i>Sistemazione Via Tetti Mauritti</i>		11.079,50	11.079,50	11.079,50
	<i>Altro</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara di cui al D.U.V.R.I. approvato con D.G.C. n°7 del 20/01/2022)</i>		350,21	350,21	350,21
	<i>Chiusura cantiere</i>		0,00	0,00	0,00
	Importo parziale settimana [€]	0,00	11.429,71		
Importo parziale settimana [%]	0,00%	100,00%			
Importo progressivo [€]	0,00	11.429,71		11.429,71	
Percentuale progressiva [%]	0,00%	100,00%			
Periodo	1	2			

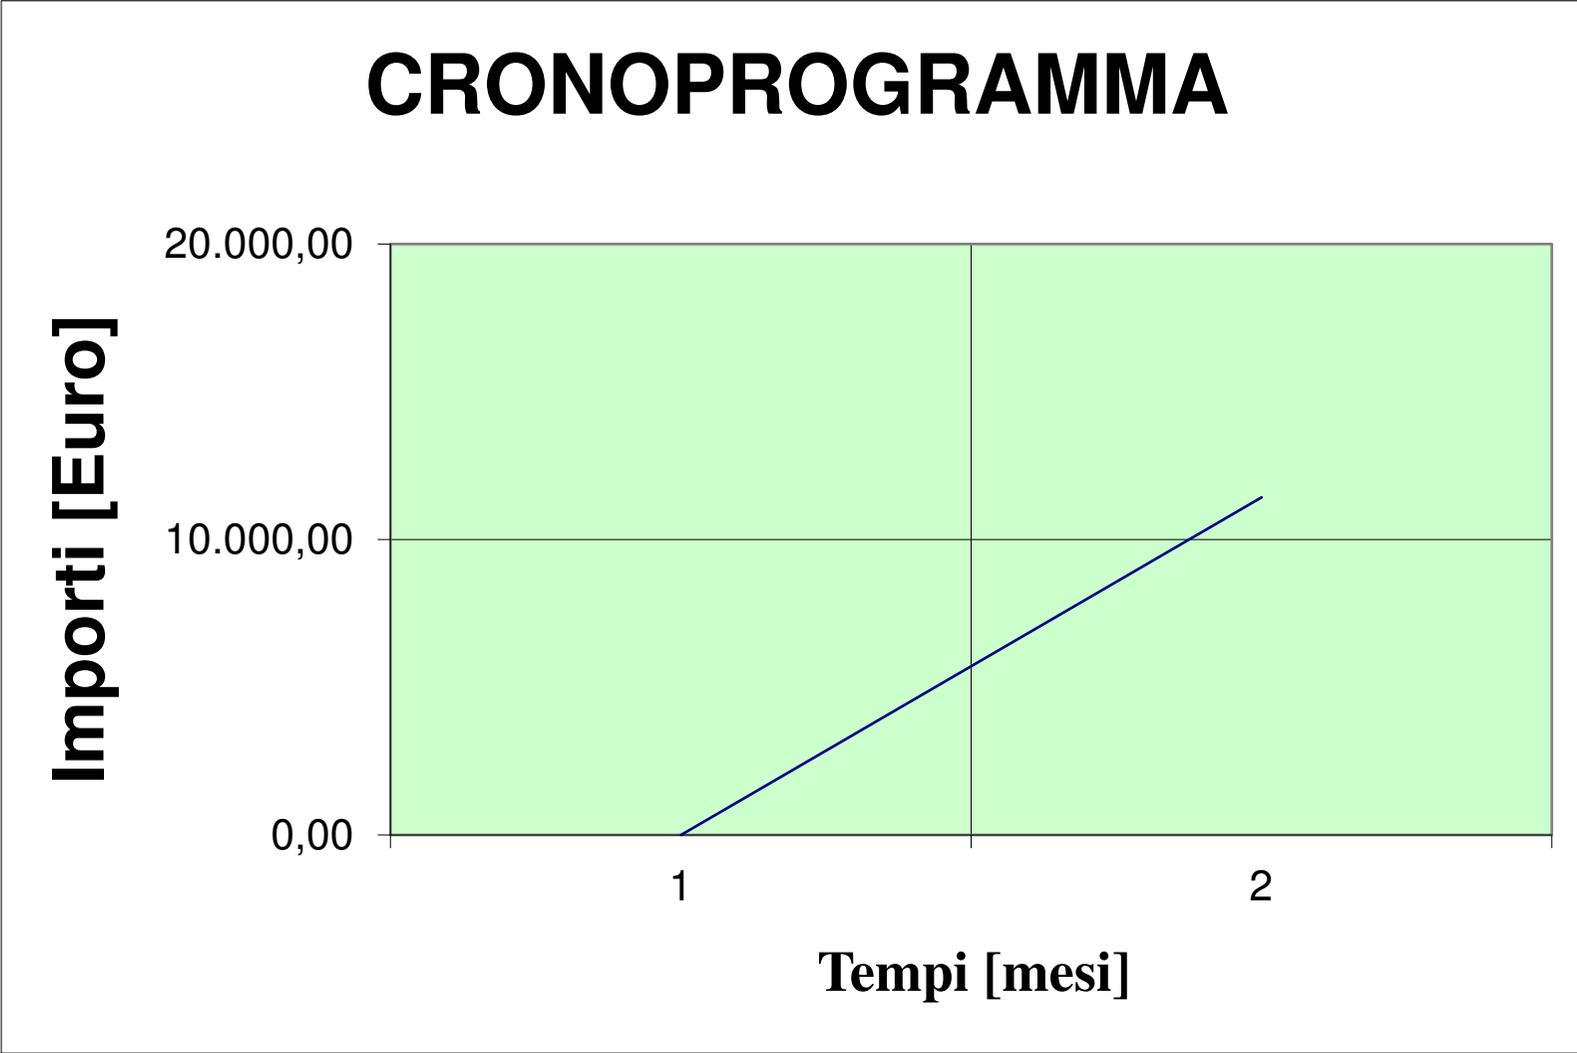

L'art. 40 del D.P.R. 207/2010 impone che vengano determinati il "tempo contrattuale" ed il "cronoprogramma delle lavorazioni".

Per il calcolo del "tempo contrattuale" che è la traduzione in "tempo meteorico" del "tempo utile lavorativo", si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'incidenza è desumibile dalla tabella, qui di seguito riportata, nella quale si è posto il valore di 100% per la produttività ottimale mensile e si è ipotizzato che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare tra il 15% ed il 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: favorevole, normale e sfavorevole. Nella fattispecie concreta, per il presente appalto, si è adottata la "condizione climatica normale".

Tabella Climatico Ambientale [%]													
Condizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82,5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58,75

Viste l'entità e la tipologia dell'intervento, si ritiene congruo ipotizzare un tempo contrattuale (cioè somma di due fattori: "tempo utile lavorativo" e tempo dovuto "all'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole") pari a 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Il cronoprogramma delle lavorazioni si desume, a partire dalla data di consegna, dai due diagrammi di seguito illustrati.
